

甘肃省酒泉监狱生活区谈话室  
改造项目 工程

投 标 总 价

JQTX2026JQ023

投 标 人： \_\_\_\_\_



(单位盖章)

陈凯



2026年6月2日

陈凯

# 投 标 总 价

招 标 人： 甘肃省酒泉监狱

工 程 名 称： 甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

投标总价（小写）： 439015.87

（大写）： 肆拾叁万玖仟零壹拾伍元捌角柒分

投 标 人： \_\_\_\_\_



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

陈凯

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_

陈凯



(造价工程师签字盖章)

编 制 时 间： 2026年6月2日

陈凯

# 总 说 明

工程名称：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

编制依据：《建设工程工程量清单计量规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-44-2013、《甘肃省安装工程预算定额》DBJD25-45-2013、《甘肃省抗震加固工程预算定额2010》、《甘肃省建筑、安装维修工程预算定额2009》、《甘肃省市政工程预算定额》（2018）、《甘肃省园林工程消耗量定额》（2005）等。本工程为三类工程，取费标准按三类计取。材料价差参照执行2026年第二期全市建设工程材料信息价格及人工信息价格市场综合指导价价格及市场询价，指导价部分主材无市场指导价，经市场询价后按实际市场价计入调整。

投标报价的其他说明：

人工费执行酒泉市住房和城乡建设局印发的《酒泉市住房和城乡建设局关于发布酒泉市2026年第二期工程建设材料信息价格及人工信息价通知》中的人工信息价。



陈凯







# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	8087.73	
二	措施项目费(费率措施费)	1400.09	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	920.29	—
	其中:社会保险费	669.3	—
	其中:住房公积金	250.99	—
	其中:环境保护税		—
五	税金	936.73	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		11,344.84	0



陈凯



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

陈凯




# 综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 5 页

项目编号		011601001001	项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	17.06	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-22	砖砌体 墙、柱	100m3	0.0100	4598.59	0	0	19.7%	45.99	0.00	0.00	9.06
1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):10000	10m3	0.1000	145.95	0	556.49	19.7%	14.60	0.00	55.65	2.88
人工费调整								24.27	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						84.85	0.00	55.65	11.93
综合工日119.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								152.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	<b>陈凯</b>										
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 2 页 共 5 页

项目编号	011609001001	项目名称	不锈钢护栏拆除		计量单位	m2	工程量	196.1				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
			数量	人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-115	推拉栅栏门	10m2	0.1000	37.66	2.72	0	19.7%	3.77	0.27	0.00	0.74	
								人工费调整	1.51	-	-	-
								材料费价差	-	0.00	-	-
								机械费调整	-	-	0.00	-
人工单价		小计					5.27	0.27	0.00	0.74		
综合工日119.05元/工日		未计价材料费					0					
清单项目综合单价							6.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	氧气			m3	0.0392	2.42	0.09					
	乙炔气			m3	0.0169	10.5	0.18					
	材料费小计					-	0.27	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 3 页 共 5 页

项目编号		011608002001	项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	875.78	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-152	涂料面	10m2	0.1000	15.9	0.03	0	19.7%	1.59	0.00	0.00	0.31
1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):10000	10m3	0.0003	145.95	0	556.49	19.7%	0.04	0.00	0.17	0.01
	人工费调整							0.65	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.29	0.00	0.17	0.32
综合工日119.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								2.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	砂纸 0-4号			张	0.022	0.16	0				
	材料费小计					-	0.00	-	0.00		
	甘肃吴坤建设工程 有限公司										
	甘肃吴坤建设工程 有限公司										
	甘肃吴坤建设工程 有限公司										
	甘肃吴坤建设工程 有限公司										
	甘肃吴坤建设工程 有限公司										
	甘肃吴坤建设工程 有限公司										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 4 页 共 5 页

项目编号		011605001001	项目名称		原地面拆除		计量单位	m2	工程量	65.11	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-141	整体面层不带混凝土垫层	10m2	0.1000	70.72	0	0	19.7%	7.07	0.00	0.00	1.39
1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):10000	10m3	0.0050	145.95	0	556.49	19.7%	0.73	0.00	2.78	0.14
	人工费调整							3.13	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.93	0.00	2.78	1.54
综合工日119.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								15.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	<b>陈凯</b>										
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

**陈凯**

# 综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 5 页 共 5 页

项目编号	011613001001	项目名称	灯具拆除	计量单位	套	工程量	60				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价			合价					
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-287	灯具拆除 吊链,吊管,吸顶,嵌入式荧光灯单管	10套	0.1000	78.72	0	0	31.11%	7.87	0.00	0.00	2.45
	人工费调整							3.44	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.32	0.00	0.00	2.45
综合工日117.87元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								13.77			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	陈凯										
	陈凯										
	B21226200000526										
	甘肃吴坤建设工程 有限公司										
	审核日期: 2022年09月07日										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			0	

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

*陈凯*

# 暂列金额明细表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—



陈凯



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

陈凯



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

LOTIX20230223

陈凯



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

陈凯



# 总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

LOTIX2023

陈凯



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

陈凯


# 规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	920.29		920.29
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	4183.15	16	669.3
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	4183.15	6	250.99
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	10408.11	9	936.73
合 计					1857.02

编制人（造价人员）：  



复核人（造价工程师）：  


表-13






# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用造价信息差额调整法)

工程名称：拆除工程                      标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目                      第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

LOTIX202309023





注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	203923.47	
二	措施项目费（费率措施费）	11604.28	—
三	其他项目费	10000	—
	暂列金额	10000	—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	10517.83	—
	其中：社会保险费	7649.33	—
	其中：住房公积金	2868.5	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	21244.1	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		257,289.68	0

陈凯



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

陈凯

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：谈话室 标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010401003001	砖砌隔墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10机砖 2. 墙体类型: 240 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	13.79	469.26	6471.1		1708.44
2	011101003001	楼地面恢复	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 100mm厚C20细石砼地面 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:2加浆抹光	m <sup>2</sup>	65.11	67.51	4395.58		1516.42
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 腻子种类: 普通腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	875.78	27.38	23978.86		9149.62
4	011207001001	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格: 细木工基层板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 防火板	m <sup>2</sup>	137.88	111.33	15350.18		2484.6
5	010809004001	大理石台面板	1. 材质、规格、颜色: 圆角大理石台面 厚55mm, 宽800mm、200mm	m <sup>2</sup>	85.79	376.97	32340.26		13897.12
6	011210006001	包立管	1. 骨架、面层材料种类、规格: 木龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 石膏板	m <sup>2</sup>	738.06	83.21	3166.97		630.27
7	011501003001	台面下成品柜	1. 台柜规格: 长3230mm*高750mm*宽500mm 2. 材料种类、规格: 木制储物柜 内饰面防火板 3. 五金种类、规格: 含五金配件安装	m	64.6	650	41990		
8	011501003002	定制药品柜	1. 台柜规格: 长600mm*高750mm*宽500mm 2. 材料种类、规格: 木制药品柜 内饰面防火板 3. 五金种类、规格: 含五金配件安装	m	12	650	7800		
9	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距: U型轻钢龙骨 300*300 2. 面层材料品种、规格: 矿棉板吊顶	m <sup>2</sup>	3700.00	103.35	39107.64		10947.11
10	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 双层欧松板+石膏板	m	76	57.01	4332.76		1164.32
11	011501018001	办公椅	1. 名称: 办公椅	把	40	250	10000		
本页小计							188933.35		41497.9

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

陈凯

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：谈话室 标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
12	010607002001	不锈钢护栏安装	1. 材料品种、规格:不锈钢护栏安装(利旧)	m2	196.1	34.94	6851.73		1941.39
13	010804007001	特种门电控装置	1. 门代号及洞口尺寸:800mm*2100mm(利旧) 2. 门框、扇材质:钢质电控门, 安装电控装置、闭门器、报警器	套	20	125.39	2507.8		1584
		分部小计					198292.88		45023.29
		措施项目							
14	011701006001	满堂脚手架		m2	378.4	14.88	5630.59		2785.02
		分部小计					5630.59		2785.02
本页小计							14990.12		6310.41
合 计							203923.47		47808.31

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 14 页

项目编号	010401003001	项目名称	砖砌隔墙	计量单位	m3	工程量	13.79				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
			数量	人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-4-3	1砖墙 水泥砂浆M7.5	m3	1.0000	123.89	220.71	5.44	30.02%	123.89	220.71	5.44	38.82
人工费调整								37.85	-	-	-
材料费价差								-	42.55	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			161.74		263.26		5.44		38.82
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费			0		0		0		0
清单项目综合单价							469.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	标准砖 240*115*53			千块	0.5394	428	230.86				
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	57.25	0.255	14.6				
	其他材料费					-	17.8	-	0.00		
	材料费小计					-	263.26	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 2 页 共 14 页

项目编号		011101003001	项目名称		楼地面恢复		计量单位	m2	工程量	65.11	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-41 换	整体面层 细石混凝土C20 厚度 40mm 实际厚度(mm):100	m2	1.0000	16.88	17.17	1.35	30.02%	16.88	17.17	1.35	5.47
11-34-1	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1:2	m2	1.0000	6.41	6.38	1.29	30.02%	6.41	6.38	1.29	2.31
人工费调整								6.77	-	-	-
材料费价差								-	3.48	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						30.06	27.03	2.64	7.78
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								67.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通硅酸盐水泥 32.5		kg	36.904	0.255	9.41	-	0.00			
	其他材料费				-	17.63	-	0.00			
	材料费小计				-	27.04	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 3 页 共 14 页

项目编号		011407001001	项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	875.78	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1028.64	0	30.02%	10.45	10.29	0.00	3.14
				人工费调整				3.07	-	-	-
				材料费价差				-	0.44	-	-
				机械费调整				-	-	0.00	-
	人工单价			小计				13.52	10.73	0.00	3.14
	二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日			未计价材料费					0		
	清单项目综合单价							27.38			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		乳胶漆 内用X08-1	kg	0.2835	11.94	3.38					
		白乳胶	kg	0.48	6.77	3.25					
		大白粉	kg	2.6	1.34	3.48					
		其他材料费				-	0.61	-	0.00		
		材料费小计				-	10.73	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 4 页 共 14 页

项目编号		011207001001		项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2		工程量		137.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-109	墙面基层 细木工板	m2	1.0000	6.26	43.08	0	30.02%	6.26	43.08	0.00	1.88				
15-124	墙面面层 防火板	m2	1.0000	11.76	63.92	0	30.02%	11.76	63.92	0.00	3.53				
人工费调整								5.16	-	-	-				
材料费价差								-	-24.26	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计				23.18		82.74		0.00		5.41			
三类工96.96元/工日；一类工119.05元/工日		未计价材料费				0		0		0		0			
清单项目综合单价								111.33							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	白乳胶			kg	0.14	6.77	0.95								
	细木工板 厚15mm			m2	1.05	38.09	39.99								
	防火板			m2	1.1	30	33								
	万能胶 1kg/瓶			kg	0.4239	19.86	8.42								
	其他材料费					—	0.38	—	0.00						
	材料费小计					—	82.74	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 5 页 共 14 页

项目编号	010809004001	项目名称	大理石台面板		计量单位	m2	工程量	85.79			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价				合价				
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-52	大理石台面	m2	1.0000	161.99	237.88	0	30.02%	161.99	237.88	0.00	48.63
				人工费调整				45.26	-	-	-
				材料费价差				-	-116.79	-	-
				机械费调整				-	-	0.00	-
人工单价			小计					207.25	121.09	0.00	48.63
三类工96.96元/工日;一类工119.05元/工日			未计价材料费					0			
清单项目综合单价							376.97				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	石材胶			kg	0.47	16.57	7.79				
	大理石板 厚25mm			m2	1.05	107.91	113.31				
	材料费小计					-	121.09	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 6 页 共 14 页

项目编号		011210006001	项目名称		包立管		计量单位	m2	工程量	38.06	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-97	墙面木龙骨 平均中距mm以内 300	m2	1.0000	8.01	30.06	0.07	30.02%	8.01	30.06	0.07	2.42
15-121	墙面面层 石膏板	m2	1.0000	8.55	20.58	0	30.02%	8.55	20.58	0.00	2.57
人工费调整								4.74	-	-	-
材料费价差								-	6.21	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						21.30	56.85	0.07	4.99
三类工96.96元/工日；一类工119.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								83.21			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	木龙骨 30*40mm		m	7.48	4.16	31.12					
	石膏板 厚9mm		m2	1.05	12.43	13.05					
	其他材料费				-	12.68	-	0.00			
	材料费小计					-	56.85	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 7 页 共 14 页

项目编号		011501003001		项目名称		台面下成品柜		计量单位		m		工程量		64.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补充主材001	台面下成品柜	m	1.0000	0	650	0	30.02%	0.00	650.00	0.00	0.00				
				人工费调整				0.00	-	-	-				
				材料费价差				-	0.00	-	-				
				机械费调整				-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.00	650.00	0.00	0.00				
				未计价材料费					650						
清单项目综合单价								650							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	台面下成品柜			m	1	650	650								
	材料费小计					-	650.00	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 8 页 共 14 页

项目编号	011501003002	项目名称	定制药品柜	计量单位	m	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
			数量	人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材002	定制药品柜	m	1.0000	0	650	0	30.02%	0.00	650.00	0.00	0.00
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	650.00	0.00	0.00
		未计价材料费							650		
清单项目综合单价									650		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	定制药品柜			m	1	650	650				
	材料费小计					-	650.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 9 页 共 14 页

项目编号		011302001001	项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	378.4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-7	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型不上人型 面层规格mm 300*300 平面	m2	1.0000	19.75	34.26	0.11	30.02%	19.75	34.26	0.11	5.96
16-65	天棚面层 矿棉板搁放在龙骨上	m2	1.0000	9.18	40.28	0	30.02%	9.18	40.28	0.00	2.76
人工费调整								7.89	-	-	-
材料费价差								-	-16.84	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						36.82	57.70	0.11	8.72
三类工96.96元/工日,一类工119.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								103.35			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	轻钢龙骨不上人型(平面)300*300			m2	1.015	20	20.3				
	吊杆			kg	0.24	13.01	3.12				
	矿棉板			m2	1.05	30	31.5				
	其他材料费					-	2.78	-	0.00		
	材料费小计					-	57.70	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 10 页 共 14 页

项目编号		010810002001	项目名称		木窗帘盒		计量单位	m	工程量	76	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-29	窗帘盒 石膏板饰面细木工板基层	m	1.0000	15.32	25.14	0.01	30.02%	15.32	25.14	0.01	4.60
	人工费调整							4.28	-	-	-
	材料费价差							-	7.66	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				19.60	32.80	0.01	4.60
	三类工96.96元/工日;一类工119.05元/工日			未计价材料费					0		
	清单项目综合单价							57.01			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	白乳胶			kg	0.03	6.77	0.2				
	石膏板 厚9mm			m2	0.4725	12.43	5.87				
	双层欧松板			m2	0.45	54.18	24.38				
	其他材料费					-	2.35	-	0.00		
	材料费小计					-	32.80	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 11 页 共 14 页

项目编号	011501018001	项目名称	办公椅		计量单位	把	工程量	40			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材003	办公椅	把	1.0000	0	250	0	30.02%	0.00	250.00	0.00	0.00
				人工费调整				0.00	-	-	-
				材料费价差				-	0.00	-	-
				机械费调整				-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	250.00	0.00	0.00
		未计价材料费							250		
		清单项目综合单价							250		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	办公椅			把	1	250	250				
	材料费小计					-	250.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 12 页 共 14 页

项目编号		010607002001		项目名称		不锈钢护栏安装		计量单位	m2		工程量	196.1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
13-106 R*0.5	安装防盗栅栏 不锈钢 人工*0.5	m2	1.0000	9.9	7.14	9.33	30.02%	9.90	7.14	9.33	5.77		
	人工费调整							2.80	-	-	-		
	材料费价差							-	0.00	-	-		
	机械费调整							-	-	0.00	-		
人工单价				小计				12.70	7.14	9.33	5.77		
二类工112.91元/工日				未计价材料费				0					
清单项目综合单价								34.94					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	陈凯 不锈钢焊丝			kg	0.15	47.58	7.14						
	材料费小计					-	7.14	-	0.00				
	B2122620000526												
	甘肃吴坤建设工程 有限公司												
	审核日期：2022年09月07日												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 13 页 共 14 页

项目编号	010804007001	项目名称	特种门电控装置		计量单位	套	工程量	20				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
			数量	人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
13-156 换	安装防火卷帘门手动装置	套	1.0000	79.2	0	0	30.02%	79.20	0.00	0.00	23.77	
								人工费调整	22.42	-	-	-
								材料费价差	-	0.00	-	-
								机械费调整	-	-	0.00	-
人工单价		小计						101.62	0.00	0.00	23.77	
二类工112.91元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价							125.39					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	陈凯											
												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 14 页 共 14 页

项目编号	011701006001	项目名称	满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	378.4			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-161	单项脚手架 满堂脚手架基本层	m2	1.0000	7.36	2.96	0.20	30.02%	7.36	2.96	0.20	2.27
				人工费调整				2.08	-	-	-
				材料费价差				-	0.01	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				9.44	2.97	0.2	2.27
二类工112.91元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价							14.88				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	陈凯										
	其他材料费					-	2.97	-	0		
	材料费小计					-	2.97	-	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	10000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料 (工程设备) 暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		10000		

注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

陈凯

# 暂列金额明细表

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	10000	
合 计			10000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

陈凯




## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

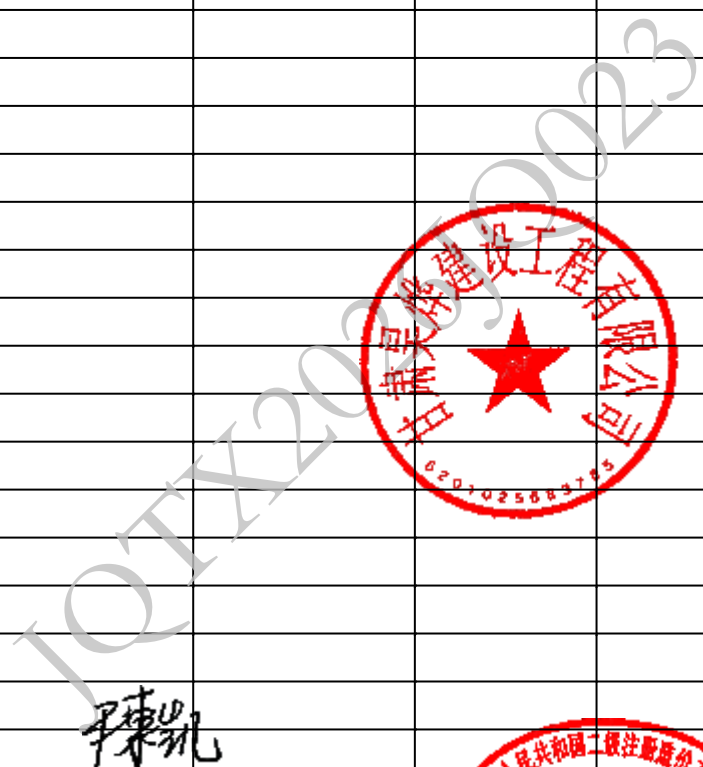

陈凯



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

陈凯



# 总承包服务费计价表


工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

QITX20230913



陈凯

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师  
 陈 凯  
 82122620000526  
 甘肃昊坤建设工程  
 有限公司  
 有效期至：2026年09月03日

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 谈话室

标段: 甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



陈凯

注: 此表由招标人填写, 供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

陈凯

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用造价信息差额调整法)

工程名称：谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注



陈凯



注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

陈凯



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：高戒备谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	3043.26	
二	措施项目费（费率措施费）	21.15	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	18.12	—
	其中：社会保险费	13.18	—
	其中：住房公积金	4.94	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	277.43	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		3,359.96	0



陈凯



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

陈凯

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高戒备谈话室 标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								暂估价	定额人工费		
		整个项目									
1	011501018002	审讯椅	1. 名称:审讯椅	把	1	2340	2340				
2	010607002002	不锈钢护栏安装	1. 材料品种、规格:不锈钢护栏安装	m2	3.08	228.33	703.26		82.37		
		分部小计					3043.26		82.37		
		措施项目									
		分部小计									
本页小计								3043.26		82.37	
合 计								3043.26			82.37

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：高戒备谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 3 页

项目编号		011501018002		项目名称		审讯椅		计量单位		把		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补充主材001	审讯椅	把	1.0000	0	2340	0	30.02%	0.00	2340.00	0.00	0.00				
				人工费调整				0.00	-	-	-				
				材料费价差				-	0.00	-	-				
				机械费调整				-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.00	2340.00	0.00	0.00				
未计价材料费								2340							
清单项目综合单价								2340							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	审讯椅			把	1	2340	2340								
	材料费小计					-	2340.00	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：高戒备谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 2 页 共 3 页

项目编号	010607002002	项目名称	不锈钢护栏安装	计量单位	m2	工程量	3.08					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
			数量	人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
17-86	不锈钢管扶手直形直径mm φ60	m	0.7143	8.51	114.41	1.48	30.02%	6.08	81.72	1.06	2.14	
17-68	不锈钢栏杆直型	m	0.7143	28.93	140.36	2.53	30.02%	20.66	100.26	1.81	6.75	
人工费调整								7.86	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计			34.60	181.98	2.86	8.89				
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费			0							
清单项目综合单价						228.33						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	不锈钢管扶手 (直形) φ60*1.5		m	0.7571	106.35	80.52						
	不锈钢焊丝		kg	0.0143	47.58	0.68						
	钨棒		kg	0.05	29.47	1.47						
	氩气		m3	0.2693	21.83	5.88						
	不锈钢焊条		kg	0.0929	26.44	2.46						
	环氧树脂		kg	0.1071	16.9	1.81						
	不锈钢管 φ32*1.5		m	3.3093	19.47	64.43						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：高戒备谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 3 页 共 3 页

	不锈钢法兰座（装饰用）Φ59	个	4.1221		6	24.73		
	材料费小计				—	181.98	—	0.00



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯


# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：高戒备谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832	0.76			
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.339	1.22			
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9.581	8.74			
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.498	4.10			
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	2.24			
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	0.39			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	1.41			
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	0.07			
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	1.85			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	0.37			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					21.15			

编制人（造价人员）： 

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高戒备谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表


工程名称：高戒备谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

LOTIX202309010023



陳凱



陳凱

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

陳凱

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高戒备谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

陈凯



注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

陈凯

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高戒备谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3  
陈凯

# 计日工表

工程名称：高戒备谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表


工程名称：高戒备谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

LOTIX2023  
陈凯



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

陈凯

# 规费、税金项目计价表

工程名称：高戒备谈话室

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	18.12		18.12
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	82.37	16	13.18
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	82.37	6	4.94
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	3082.53	9	277.43
合 计					295.55

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

陈凯









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
1		设备安装							
1	030412005001	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:600*600 (方形) 3. 安装形式:吸顶安装	套	40	265.47	10618.8		653.2
2	030507008001	摄像头拆除利旧安装	1. 名称:摄像头 2. 安装方式:墙面壁装 3. 原有摄像头拆除利旧、安装	台	40	253.42	10136.8		5629.2
3	030502001001	网络机柜	1. 名称:原有机柜移位安装 2. 其他:接线, 达到正常使用要求	台	4	558.79	2235.16		1186.4
4	030501013001	台式计算机	1. 名称:台式计算机 2. 规格:正版Windows操作系统 8GB+512GB+1TB	台	20	5281.2	105624		907.2
5	030502017001	监听耳机	1. 名称:监听耳机	个	20	341.12	6822.4		591.2
6	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	40	9.15	366		113.56
		分部小计					135803.16		9080.76
2		配管、配线							
7	030411002001	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:25*15	m	320	14.73	4713.6		2065.6
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-3*25+2*16 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括电缆头、铜端子制作安装	m	24	111.85	2684.4		163.45
9	030411004001	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	200	4.19	838		151.2
10	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络配线 2. 规格:超五类四对双绞线 3. 敷设方式:线槽敷设	m	200	4.34	868		196.56
11	030411004002	配线	1. 名称:电话线 2. 型号、规格:RVB-2*1.0 3. 配线形式:线槽敷设	m	400	4.01	1604		247.96
		分部小计					10708		2824.77
		措施项目							
本页小计							146511.16		11905.53

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

陈凯

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		分部小计								
本页小计										
合 计								146511.16		11905.53

QTY2023090223

陈凯



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 11 页

项目编号		030412005001		项目名称		平板灯		计量单位		套		工程量		40		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-1272	方型吸顶灯矩型罩	10套	1.1000	163.3	2365.57	0	42.62%	16.33	236.56	0.00	6.96					
				人工费调整					5.62	-	-	-				
				材料费价差					-	0.00	-	-				
				机械费调整					-	-	0.00	-				
	人工单价			小计					21.95	236.56	0.00	6.96				
	二类工112.91元/工日			未计价材料费						227.25						
	清单项目综合单价								265.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	平板灯 600*600				套	1.01	225	227.25								
	其他材料费						-	9.31	-	0.00						
	材料费小计						-	236.56	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 2 页 共 11 页

项目编号	030507008001	项目名称	摄像头拆除利旧安装	计量单位	台	工程量	40				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-925 换	电视监控设备安装 摄像设备及附件安装 彩色CCD带定焦镜头 人工*0.5,材料*0,机械*0.5	台	1.0000	46.91	0	0	42.62%	46.91	0.00	0.00	19.99
8-925	电视监控设备安装 摄像设备及附件安装 彩色CCD带定焦镜头	台	1.0000	93.82	0.91	4.36	42.62%	93.82	0.91	4.36	39.99
人工费调整								47.44	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						188.17	0.91	4.36	59.98
二类工112.91元/工日;一类工139.05元/工日		小计价材料费						0			
清单项目综合单价								253.42			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0.91	-	0.00		
	材料费小计					-	0.91	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 3 页 共 11 页

项目编号	030502001001	项目名称	网络机柜	计量单位	台	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价				合价				
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-26	其它柜	台	1.0000	100.04	2.13	22.16	31.11%	100.04	2.13	22.16	31.12
8-213	安装机柜、机架落地式	台	1.0000	196.56	11.59	0	42.62%	196.56	11.59	0.00	83.78
			人工费调整					111.41	-	-	-
			材料费价差					-	0.00	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价		小计					408.01	13.72	22.16	114.90
	二类工112.91元/工日,综合工日117.87元/工日		未计价材料费					0			
清单项目综合单价						558.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	陈凯						—	13.71	—	0.00	
	其他材料费					—	13.71	—	0.00		
	材料费小计										
	甘肃吴坤建设工程 有限公司										
	有效期: 2022年09月01日										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 4 页 共 11 页

项目编号	030501013001	项目名称	台式计算机	计量单位	台	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价			合价					
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-446	微机硬件	台	1.0000	45.36	5200.9	0	42.62%	45.36	5200.90	0.00	19.33
	人工费调整							15.61	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价		小计					60.97	5200.90	0.00	19.33
	二类工112.91元/工日		未计价材料费						5200		
清单项目综合单价						5281.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	台式计算机 正版Windows操作系统 8GB+512GB+1TB			台	1	5200	5200				
	其他材料费					-	0.9	-	0.00		
	材料费小计					-	5200.90	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 5 页 共 11 页

项目编号	030502017001	项目名称	监听耳机	计量单位	个	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价			合价					
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-442	多媒体会议系统设备安装、调试 红外线接收机(含耳机)	台	1.0000	29.56	288.9	0	42.62%	29.56	288.90	0.00	12.59
	人工费调整							10.07	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计					39.63	288.90	0.00	12.59	
二类工112.91元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费					280				
清单项目综合单价						341.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	监听耳机			台	1	280	280				
	其他材料费					-	8.9	-	0.00		
	材料费小计					-	288.90	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 6 页 共 11 页

项目编号	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	40				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
			数量	人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1265	暗装接线盒	10个	1.1000	28.39	41.28	0	42.62%	2.84	4.13	0.00	1.21
人工费调整								0.98	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					3.82	4.13	0.00	1.21	
二类工112.91元/工日		未计价材料费					2.63				
清单项目综合单价							9.15				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	接线盒			个	1.02	2.58	2.63				
	其他材料费					-	1.5	-	0.00		
	材料费小计					-	4.13	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 7 页 共 11 页

项目编号		030411002001		项目名称		线槽		计量单位		m		工程量		320	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1150	塑料线槽敷设 线槽断面周长 (mm以内)120	10m	0.1000	64.55	33.06	0	42.62%	6.46	3.31	0.00	2.75				
	人工费调整							2.22	-	-	-				
	材料费价差							-	0.00	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
	人工单价	小计						8.68	3.31	0.00	2.75				
	二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日	未计价材料费									2.65				
	清单项目综合单价										14.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	PVC线槽 25*15			m	1.05	2.52	2.65	-	0.00						
	其他材料费					-	0.66	-	0.00						
	材料费小计					-	3.31	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 8 页 共 11 页

项目编号		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-381 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm <sup>2</sup> 以下)35 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.0100	685.03	9968.4	11.12	42.62%	6.81	99.68	0.11	2.90				
	人工费调整							2.35	-	-	-				
	材料费价差							-	0.00	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
人工单价		小计										9.16	99.68	0.11	2.90
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费										97.81			
清单项目综合单价								111.85							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	YJV-3*25+2*16			m	1	97.809	97.81								
	其他材料费					-	1.88	-	0.00						
	材料费小计					-	99.69	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 9 页 共 11 页

项目编号		030411004001		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		200	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面(mm <sup>2</sup> 以内)2.5	100m单线	0.0100	75.6	285.36	0	42.62%	0.76	2.85	0.00	0.32				
				人工费调整				0.26	-	-	-				
				材料费价差				-	0.00	-	-				
				机械费调整				-	-	0.00	-				
	人工单价	小计						1.02	2.85	0.00	0.32				
	二类工112.91元/工日	未计价材料费							2.68						
	清单项目综合单价								4.19						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	BV-2.5mm <sup>2</sup>			m	1.16	2.31	2.68	-	0.00						
	其他材料费					-	0.17	-	0.00						
	材料费小计					-	2.85	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 10 页 共 11 页

项目编号		030502005001		项目名称		双绞线缆		计量单位		m		工程量		200		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
8-78	穿放、布放双绞线缆管/暗槽内穿放(对以内)4	100m	0.0100	98.28	255.86	4.57	42.62%	0.98	2.56	0.05	0.42					
				人工费调整				0.34	-	-	-					
				材料费价差				-	0.00	-	-					
				机械费调整				-	-	0.00	-					
	人工单价			小计				1.32	2.56	0.05	0.42					
	二类工112.91元/工日			未计价材料费					2.55							
	清单项目综合单价							4.34								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	超五类四对双绞线			m	1.02	2.5	2.55	-	0.00							
	其他材料费					-	0.01	-	0.00							
	材料费小计					-	2.56	-	0.00							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯

# 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 11 页 共 11 页

项目编号		030411004002		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		400	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1185	管内穿线 多芯软导线(二芯以内) 导线截面(mm2以内)1.0	100m单根	0.0100	561.99	291.64	0	42.62%	0.62	2.92	0.00	0.26				
				人工费调整				0.21	-	-	-				
				材料费价差				-	0.00	-	-				
				机械费调整				-	-	0.00	-				
	人工单价	小计						0.83	2.92	0.00	0.26				
	二类工112.91元/工日	未计价材料费						2.73							
清单项目综合单价								4.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	RVB-2*1.0				m	1.08	2.53	2.73							
	其他材料费						-	0.18	-	0.00					
	材料费小计						-	2.92	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈凯



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

陈凯


# 暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

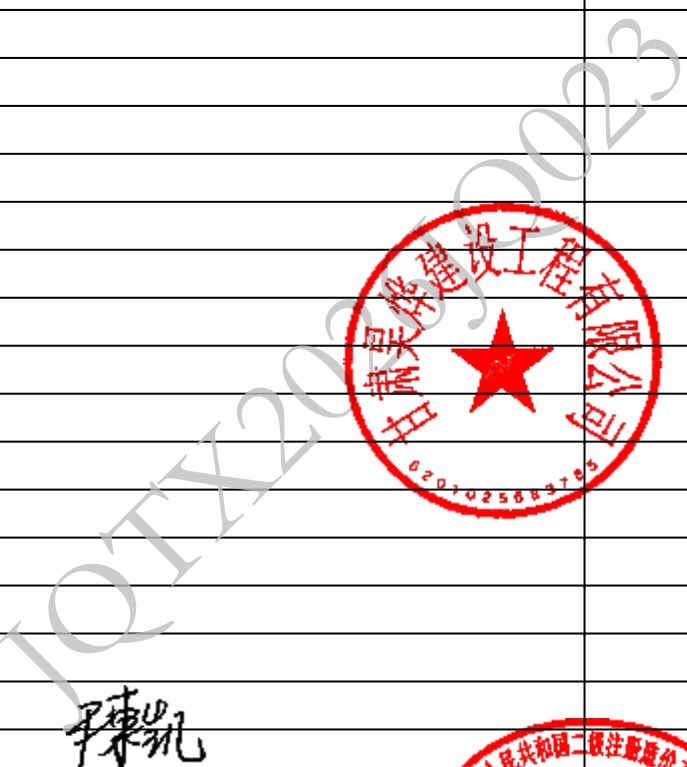

陈凯



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

陈凯

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2  
*陈凯*


# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

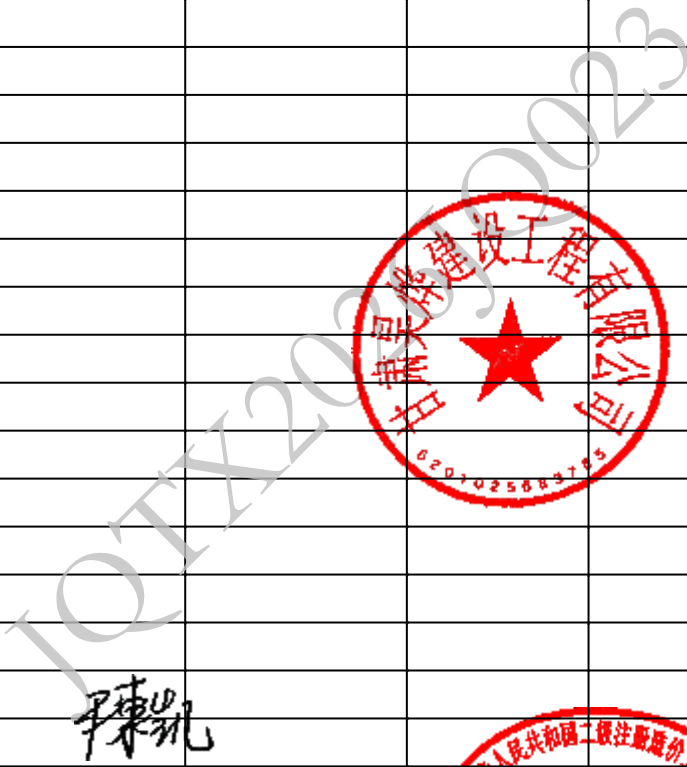

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

陈凯

# 计日工表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总 计							



陈凯



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						



陈凯



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

陈凯

# 规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	2619.21		2619.21
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	11905.53	16	1904.88
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	11905.53	6	714.33
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	153230.63	9	13790.76
合 计					16409.97

QITX20230023



陈凯



编制人（造价人员）：


复核人（造价工程师）：

陈凯

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程
标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目
第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

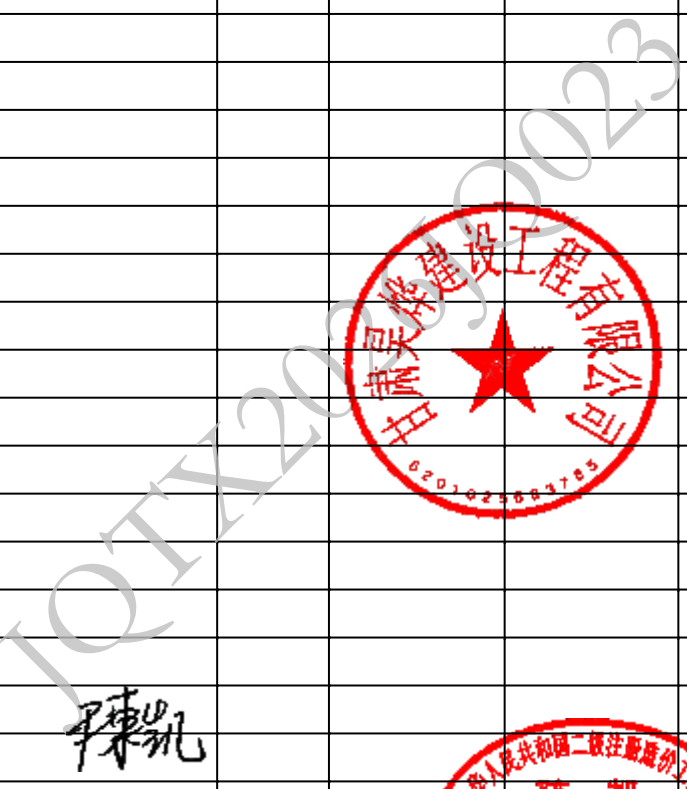

陈凯



注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：甘肃省酒泉监狱生活区谈话室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注



陳凱



注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

陳凱

